



### สัญญาจ้าง

ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและฝิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ (โครงการ ๑) (สรก.)  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ งาน

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๑๙๓๓๔๘๓ โดยรองศาสตราจารย์สุชสมัย สุทธิบัติ รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอคอน สมารท์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๐๐๒๙๕๒๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๔๗๙ หมู่ที่ ๔ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยนายปรัชญาเกรียงไกร อู่สุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๐๐๑๙๙๐ ลงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

#### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและฝิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ (โครงการ ๑) (สรก.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ งาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

#### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน ๑๖ หน้า  
จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและฝิวจราจรฯ

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาฯ จำนวน ๔ หน้า  
ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ หน้า  
เลขที่ ๖๑๐๓๑๖๐๐๑๓๕๘๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาแบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖ จำนวน ๖ หน้า  
และแบบ ปร.๕ (ก) ของบริษัทฯ

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๔ หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาแบบรูปและรายการละเอียด ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑๕ หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้รับจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของบริษัท ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๙ ถนนรามคำแหง แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๐๐๐๑๗๒๓๓๐๐๓ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๙,๔๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน อีเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้าง พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบ งานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๖,๗๘๘,๘๘๘.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๗๕๒,๕๔๔.๐๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๘,๘๘๘.๘๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้-

๑. แนวที่ ๑: ระยะทางประมาณ ๓๒ เมตร (แบบขยาย ๑)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. ยาแนวครึ่งท่อ พร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐ แล้วเสร็จ
- ปรับสภาพพื้นที่ดินตามเดิม แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมระบบท่อลงบ่อเก็บน้ำพร้อม ดาด ค.ส.ล. ปากทางปล่อยน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ

๒. งานบ่อพัก: ด้านหลังอาคาร KLB (แบบขยาย ๑)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่และย้ายดินเดิม แล้วเสร็จ
- งานขุดดินบ่อ แล้วเสร็จ
- งานป้องกันดินพังทลายขณะขุดดิน แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๒.๐๐ m. (ห่อตามแบบ) แล้วเสร็จ
- แผ่นผนังกันดิน แล้วเสร็จ
- งานคาน GB๑, GB๒ แล้วเสร็จ
- งานคาน GB๓ แล้วเสร็จ
- งานบ่อคักขยะ ทั้งหมด



Prachya





ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้  
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๘,๘๘๘.๘๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้.-

แนวที่ ๒: ระยะทางประมาณ ๑๖๖ เมตร (แบบขยาย ๒)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. ยานแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบแล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ยานแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๒.๒๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐/๑ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๘๐ m. MH-๑๒๐ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ m. MH-๑๒๐/๑ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- ปรับสภาพพื้นที่คืนตามเดิม แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทั้งหมด

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้  
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๘,๘๘๘.๘๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้.-

แนวที่ ๓: ระยะทางประมาณ ๑๕๖ เมตร (แบบขยาย ๓)


- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ยานแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๘๐ m. MH-๑๒๐ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ m. MH-๑๒๐/๑ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- ปรับสภาพพื้นที่คืนตามเดิม แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทั้งหมด

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้  
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๕๗,๗๗๗.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้.-

แนวที่ ๔: ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร (แบบขยาย ๔)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ

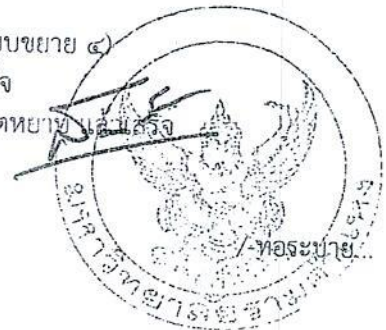

- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. ยาแนวครึ่งท่อ พร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ยาแนวครึ่งท่อ พร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๒.๒๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐/๑ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๘๐ m. MH-๑๒๐ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ m. MH-๑๒๐/๑ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- ปรับสภาพพื้นที่ดินตามเดิม แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทั้งหมด

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๕๗,๗๗๗.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้.-

๑. แนวที่ ๕: ระยะทางประมาณ ๗๘ เมตร (แบบขยาย ๕)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ ม. ยาแนวครึ่งท่อ พร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๒.๒๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐/๑ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- ปรับสภาพพื้นที่ดินตามเดิม แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ

๒. แนวที่ ๖: ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร (แบบขยาย ๖)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ยาแนวครึ่งท่อพร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๘๐ m. MH-๑๒๐ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๒.๒๐x๒.๒๐ m. MH-๑๕๐/๑ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- ปรับสภาพพื้นที่ดินตามเดิม แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทั้งหมด

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



Prachya





งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๘,๘๘๘.๘๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้.-

แนวที่ ๗: ระยะทางประมาณ ๑๓๙ เมตร (แบบขยาย ๗)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ยานวนครึ่งท่อ พร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๐x๑.๘๐ m. MH-๑๒๐ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- ปรับสภาพพื้นที่คืนตามเดิม แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทั้งหมด

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๕๗,๗๗๗.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้.-

๑. แนวที่ ๘: ระยะทางประมาณ ๙๓ เมตร (แบบขยาย ๘)

- งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานขุดดินวางท่อพร้อมเทคอนกรีตหยาบ แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยานวนครึ่งท่อ พร้อมลงทรายฝังกลบ แล้วเสร็จ
- งานบ่อพักขนาด ๑.๓๘x๑.๕๐ m. MH-๑๐๐ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- ปรับสภาพพื้นที่คืนตามเดิม แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ

๒. งานทั่วไป:

- งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำของเดิมเข้าแนวท่อใหม่ในแนวที่ท่อใหม่ตัดผ่าน แล้วเสร็จ
- งานปรับระดับขอบคันหินและทางเท้า แล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด (เตรียมถนนชั่วคราว หลบแนวท่อไฟฟ้าได้และอื่นๆ) แล้วเสร็จ
- งานส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาดพร้อมส่งงาน ทั้งหมด

ตามแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขานนรรมคำแหง ๑๕๑ ชื่อบัญชี บจก.ไอคอน สมารท์ เลขที่บัญชีเงินฝาก ๗๓๕-๑-๐๕๓๐๘-๓ ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนหรือการใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีทุกเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนี้ๆ



Prachya





ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอด เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเหล่านั้น



Prachya



ให้อ้อวาง



ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างรวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยที่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม



Prachya





หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้าง จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมี สิทธิที่จะสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองาน ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคา ใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะ กำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๖,๗๘๘.๘๘ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๖๕๐.- บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมามีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่ จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผู้รับจ้างหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



Prachya





ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ



Irachya





มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้า สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมแรงงานของทางราชการ หรือมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละ สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ๒๑.๑ ช่างปูน
- ๒๑.๒ ช่างก่อสร้าง
- ๒๑.๓ ช่างเชื่อม
- ๒๑.๔ ช่างเหล็ก
- ๒๑.๕ ช่างสี
- ๒๑.๖ ช่างประปา
- ๒๑.๗ ช่างไฟฟ้า
- ๒๑.๘ วิศวกรควบคุมงานตลอดเวลา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตั้งกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงเรือ ทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของ ผู้รับจ้าง

สัญญาให้เขียนเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ..... Prachya .....ผู้รับจ้าง  
(นายปรัชญาเกรียงไกร อู่สุวรรณ)

ลงชื่อ..... [Signature] .....ผู้ว่าจ้าง  
(รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบัติ)  
รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลงชื่อ..... [Signature] .....พยาน  
(นางสาวนัทธชนัน สุคันธนนท์)

ลงชื่อ..... [Signature] .....พยาน  
(นายบรรดพล แสงขำ)
